


敦賀発電所 2 号機 機器ドレン蒸発装置 給水フィルタ差圧計受圧部からの水漏れについて

敦賀発電所 2 号機は、第 1 8 回定期検査中のところ、平成 2 9 年 1 月 6 日 1 3 時 6 分頃、当社保修室員が、原子炉補助建屋地下 1 階（管理区域）の機器ドレン蒸発装置※¹ 給水フィルタ差圧計受圧部にごく僅かな漏れ跡および、その下の床面に水溜り（約 1 5 cc）※²を発見しました。
その後、直ちに当該差圧計入口弁を閉止しており、水漏れは停止しております。
今後、原因について調査を行います。
本事象による周辺環境への影響はありません。

※ 1：放射性廃液を濃縮処理する設備


※ 2：漏れ跡および漏えいした水の放射能量は、約 $8.4 \times 10^{-2} \text{Bq}$ （法律に基づく報告基準は $3.7 \times 10^{-6} \text{Bq}$ ）

敦賀発電所 2 号機 配置図

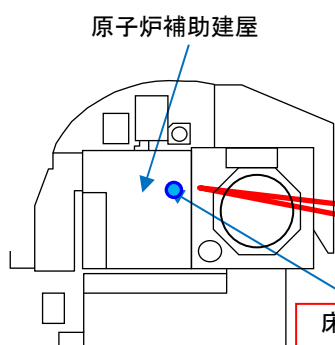


床面の漏れ場所

原子炉補助建屋 地下 1 階

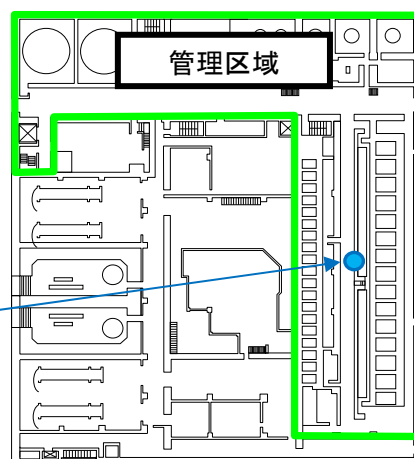

機器ドレン蒸発装置給水系概略図

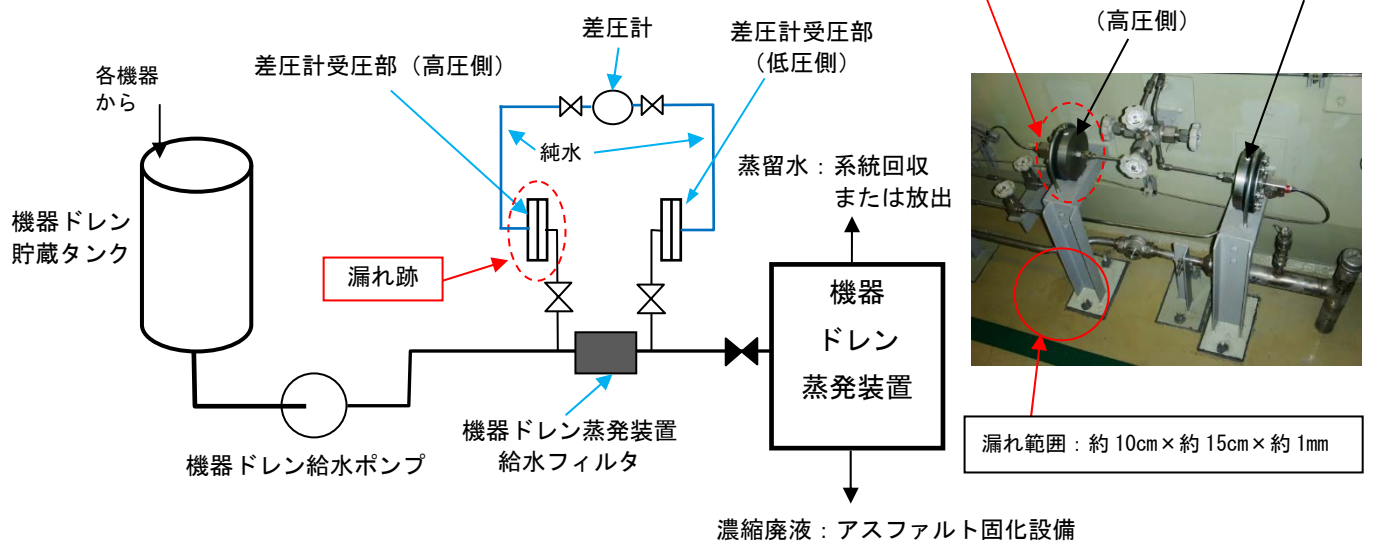

以 上
